



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Contraloría Interna Municipal
11 de Noviembre de 2019
CM/CIED/3198/2019

ING. JOSÉ MARCO ANTONIO URIBE ÁVILA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. –

At´n.: Lic. Ernestina Flores del Castillo
Enlace de Evaluación del Desempeño

Reciba un cordial saludo, en seguimiento con los objetivos y metas planteadas por este Órgano de Control Interno en materia de evaluación del desempeño, la cual es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas a fin de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales y otorgar información fundamental en la determinación del impacto social que tienen los recursos públicos.

A través del presente me permito enviarle los resultados de la evaluación trimestral respecto a la eficacia, eficiencia, economía y calidad en el logro de objetivos y metas de los programas sujetos a evaluación, correspondientes al tercer trimestre Julio – Septiembre 2019, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales deberán ser atendidos a la brevedad posible, con el fin de quedar solventados para la evaluación del siguiente trimestre y así contribuir a mejorar la gestión de la Dirección que tiene a su honoroso cargo.

Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XII, 61 fracción II inciso c y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 6 fracción II y V, 29 y 31 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí.

Sin otro particular y agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



c.c.p. Archivo
c.c.p. Mtro. Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal de San Luis Potosí
c.c.p. Lic. Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal
c.c.p. Lic. Jorge Francisco Arias Hernández, Secretario Técnico
CPJML/L'EVA/jmmm

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel. (444) 834 54 00

San Luis ¡Suenas fuerte!



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad)

Trimestre
Julio-Septiembre 2019

Dependencia/Entidad/Órgano evaluado:
Dirección de Obra Pública

San Luis ¡Suena fuerte!



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas, proyectos y/o fondos.

La evaluación trimestral de resultados tiene como base el Programa Anual de Seguimiento 2019, emitido por la Contraloría Interna Municipal y aprobado por el Comité de Evaluación del Desempeño, además de estar en estricto apego con lo establecido en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí, también emitidos por la Contraloría Interna Municipal y aprobados por el Comité de Evaluación del Desempeño.

2. Objetivo

Verificar periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos, con base en el sistema de evaluación del desempeño, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la administración pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

3. Fundamento Legal

- Artículos 26 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 135, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
- Artículos 4 fracción XII, 61 fracción II inciso c) y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Artículos 6 fracción II y V, 29, 31 y 39 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de San Luis Potosí.
- Programa Anual de Seguimiento 2019.



4. Metodología

I. Indicadores

La evaluación de eficacia, eficiencia, economía y calidad es realizada por trabajo de gabinete y trabajo de campo en los casos necesarios. Así, el presente informe incluye un análisis de acuerdo con el criterio analizado, conforme al siguiente listado:

Eficacia: Analiza el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Metas Alcanzadas}}{\text{Metas Programadas}} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas y/u objetivos, se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración de Indicador de Eficacia

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Eficacia > 28%	28% > Eficacia > 23%	Eficacia < 23%

Economía: Mide la capacidad de la unidad responsable para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. De forma trimestral se recomienda calcularlo de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Economía} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$$

Para la valoración de la economía, se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración de Indicador de Economía

Adecuado	Atención Operacional	Deficiente
Economía = > 28%	28% > Economía > 24%	Economía < 24%



Eficiencia: Mide la relación entre el logro de objetivos del Programa presupuestario (Pp) y los recursos utilizados para su cumplimiento. De forma trimestral se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Eficacia}}{\text{Economía}} \times 100$$

Para la valoración de la eficiencia, se establecen los siguientes parámetros y requisitos:

Valoración	Parámetro	Requisitos
Adecuado	33.3% > Eficiencia > 28%	Eficacia > 28% Economía > 28%
Atención Operacional	28% > Eficiencia > 23%	28% > Eficacia > 24% 28% > Economía > 24%
Deficiente	Cualquier resultado que surja por no cumplir con los requisitos establecidos.	Eficacia < 23% Economía < 24%

Calidad: Capacidad de una entidad de carácter público para prestar bienes y servicios que respondan a las problemáticas de las diferentes realidades municipales.

$$\text{Calidad} = \frac{\text{Beneficiarios satisfechos}}{\text{Total de Beneficiarios}} \times 100$$

La metodología anterior podrá ser modificada de acuerdo con las características específicas de cada Programa presupuestario (PP).

II. Momentos Contables de acuerdo con el CONAC

Gasto Modificado: El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: El gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y



servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto Devengado: El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

5. Notas Metodológicas.

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa <de cada cien unidades>.
- b) Al ser evaluaciones trimestrales, la metodología establecida en el punto cuatro considera de igual manera valoraciones máximas trimestrales. Así, para lo anterior, todo resultado de eficacia, eficiencia, economía y calidad ha sido ponderado a esta medición.

Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustarán automáticamente al máximo señalados en los parámetros de valoración anteriormente mencionados.

b) Posterior al cálculo ponderado de la Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:

- Los indicadores con resultado superior a 33.33% se normaliza su resultado a 33.33%.
- Para el caso de la eficiencia, es erróneo interpretar un excedente como una situación favorable, dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía.
- Para el caso de Economía, el presupuesto que se asigna de manera anual, en atención técnica a la metodología empleada es necesario dividir el presupuesto denominado *modificado* entre el número de trimestres restantes a partir de la asignación presupuestal del programa presupuestario y/o proyecto.



6. Análisis y Resultados.

A continuación, se presenta el análisis y los resultados obtenidos del trabajo de gabinete de este Órgano de Control Interno, considerando los proyectos y/o programas presupuestarios sujetos a monitoreo trimestral, mismos que ascienden a los **diecinueve millones de pesos**.

Se señala que estos programas cuentan con presupuesto asignado y objetivos generales elaborados por el área para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 de la Dirección de Obras Públicas desde el mes de Mayo en su mayoría.

El presente análisis se desarrolló utilizando la información con corte al día 30 de Septiembre de 2019, brindada por la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal. Cabe destacar, que en cuanto a la medición de calidad la Unidad Administrativa evaluada declaro lo siguiente en todos los programas sujetos a monitoreo:

“La medición de la calidad se determinará mediante la suscripción y rúbrica de las actas de entrega recepción de todas y cada una de las obras, en donde se refleja la valoración del Comité de Obra, quien se encarga de verificar el adecuado cumplimiento de los objetivos del contrato de obra de las acciones referidas”

Por lo que para el presente trimestre no se cuenta con la información necesaria para determinar nivel de calidad en los programas y/o proyectos ejercidos.

De lo anterior, se presenta lo siguientes resultados específicos:

6.1.- Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N

Asignación presupuestal: \$798,650.00


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es




contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

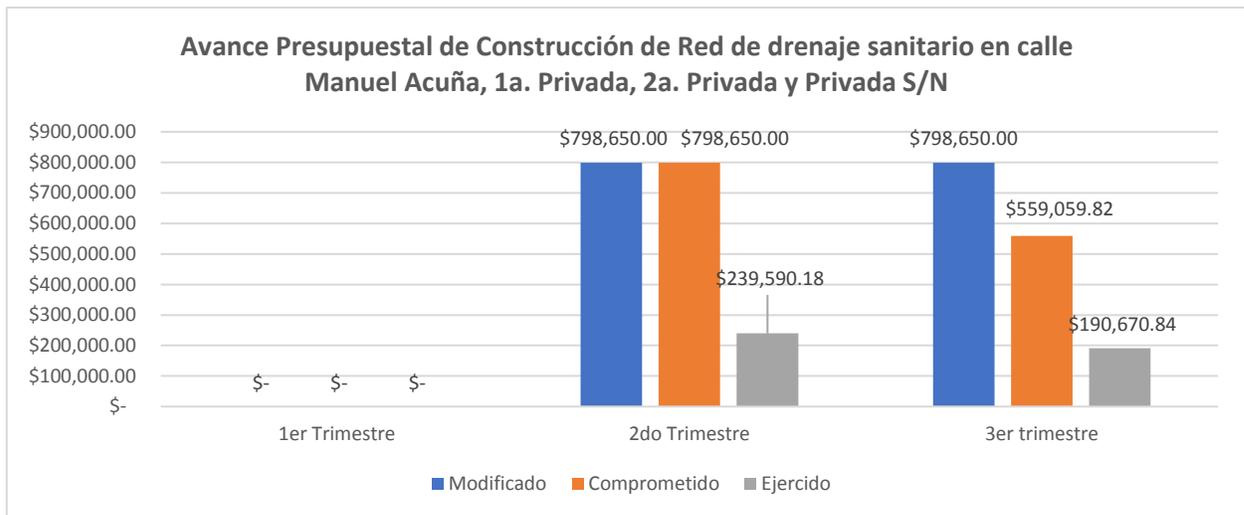

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

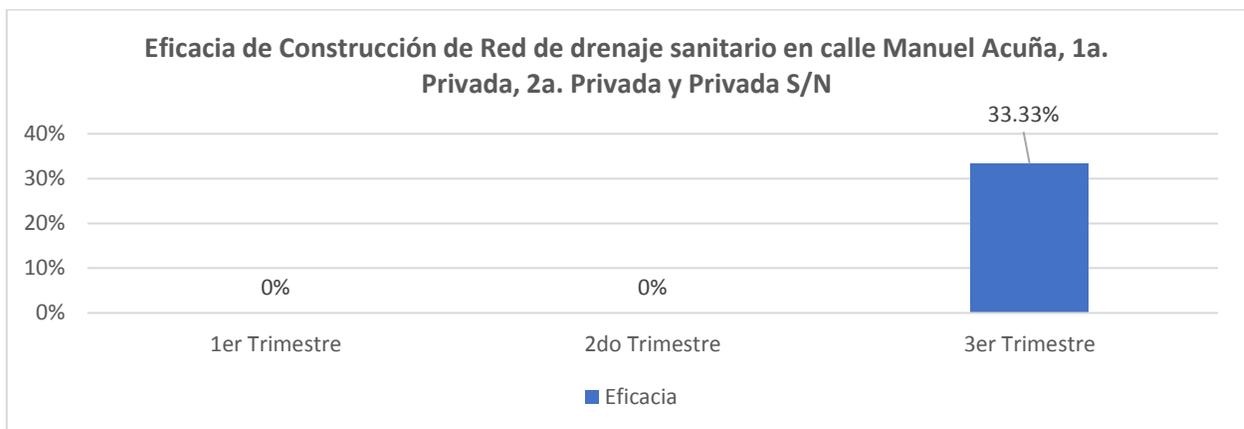


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

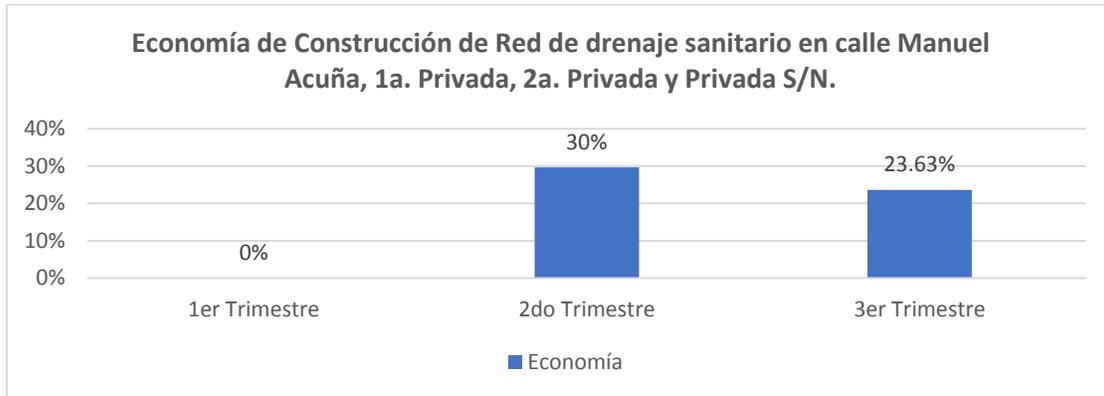

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.1.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad ponderados y normalizados

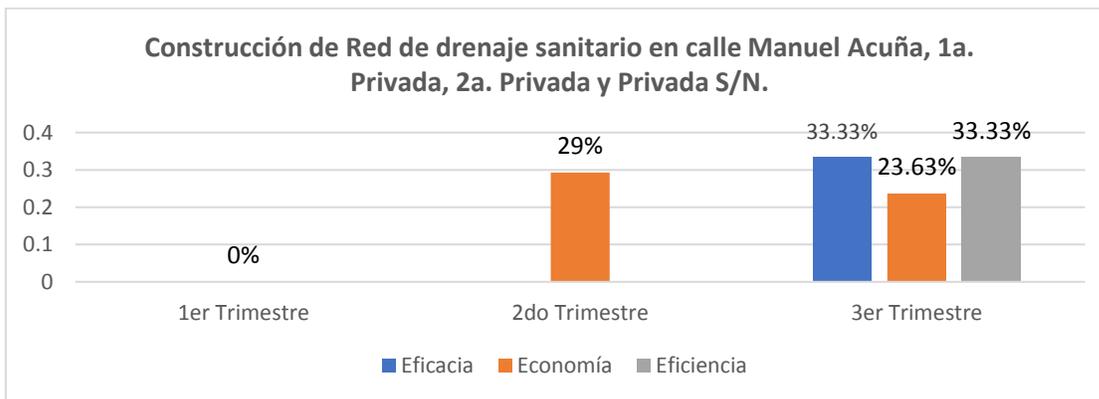

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; sin embargo, estas no las lleva a cabo de manera completamente gradual con respecto al ejercicio de los recursos ya que estos requieren de atención operacional pues al determinar la ponderación de la dimensión de economía, esta obtiene un resultado del 23.63%.




6.2.- Construcción de Red de drenaje sanitario en privada Bugambilias de la Cruz.

Asignación presupuestal: \$534,050.00


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizando materiales duraderos.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

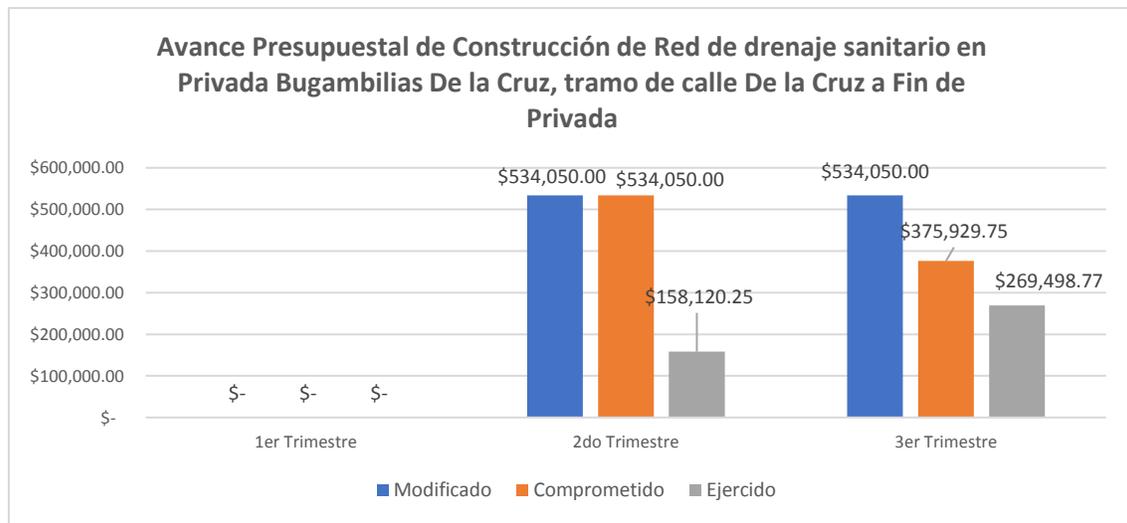

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

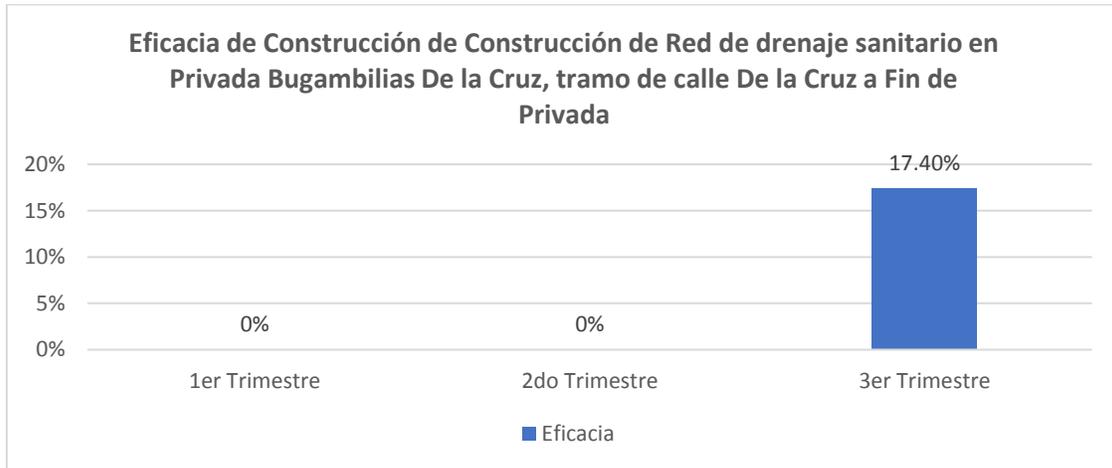


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

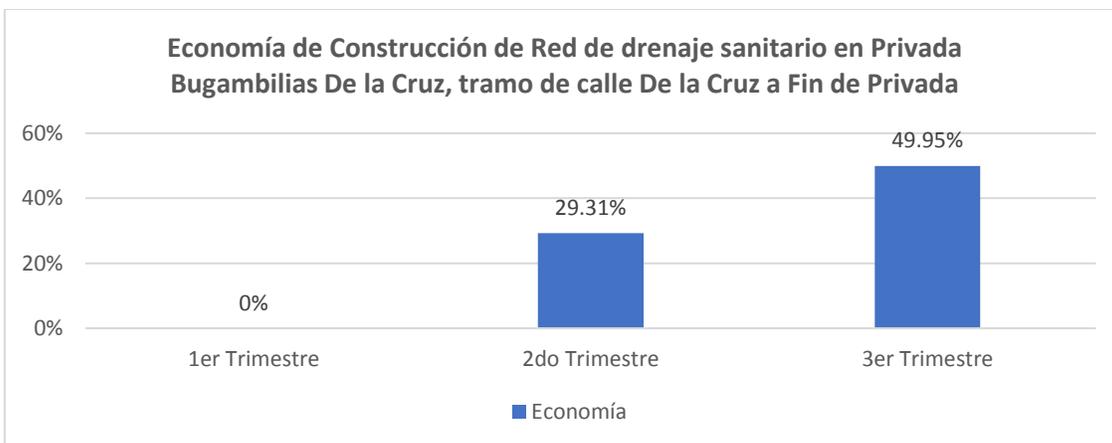

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.2.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

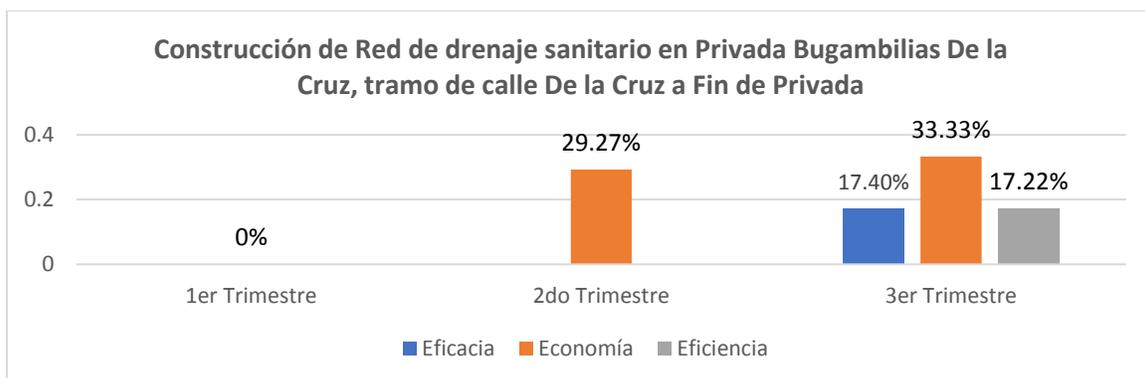

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.



Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es poco eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados no son proporcionales o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente. Es decir la Dirección de Obras Públicas pudiese estar obteniendo mas y mejores resultados si se considera que está ejerciendo todo el recurso programado en el trimestre.


6.3.- Construcción de Red de drenaje sanitario en 1ª. Privada de Colorines.

Asignación presupuestal: \$540,250.00


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizando materiales duraderos.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

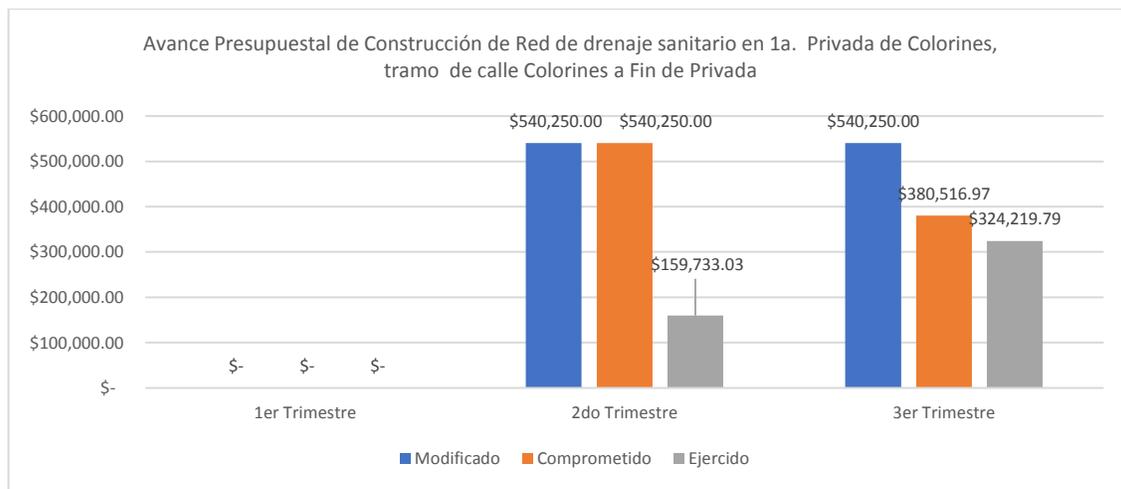

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

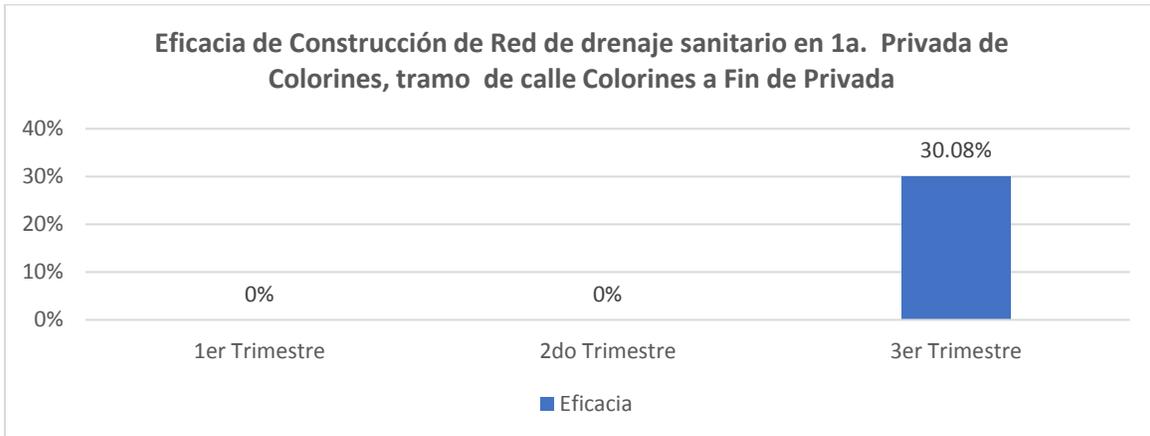


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

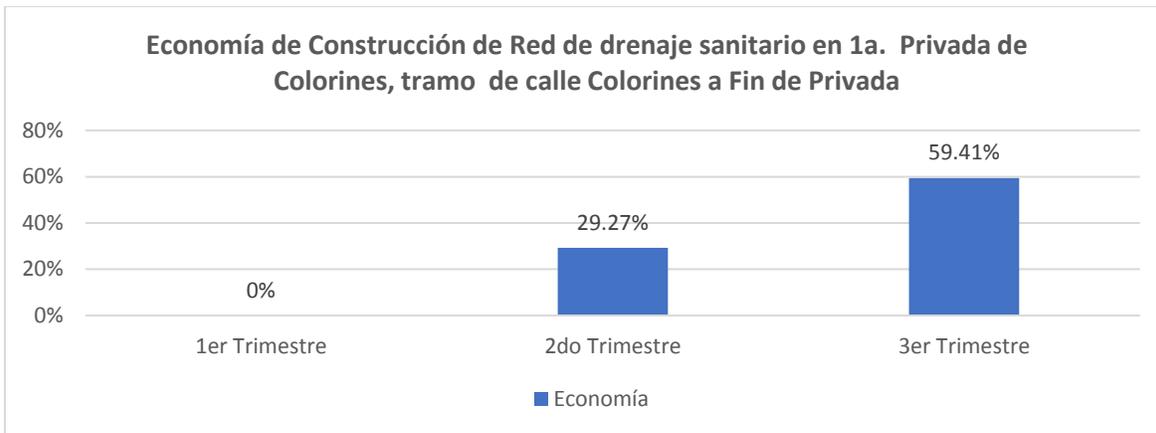

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.3.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

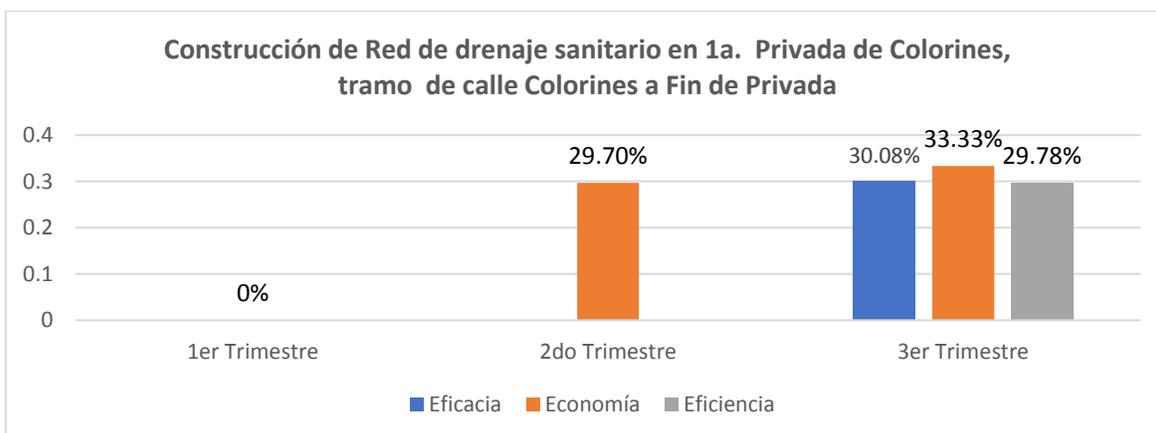



Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente.


6.4.- Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe.

Asignación presupuestal: \$1,046,140.00


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizando materiales duraderos.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

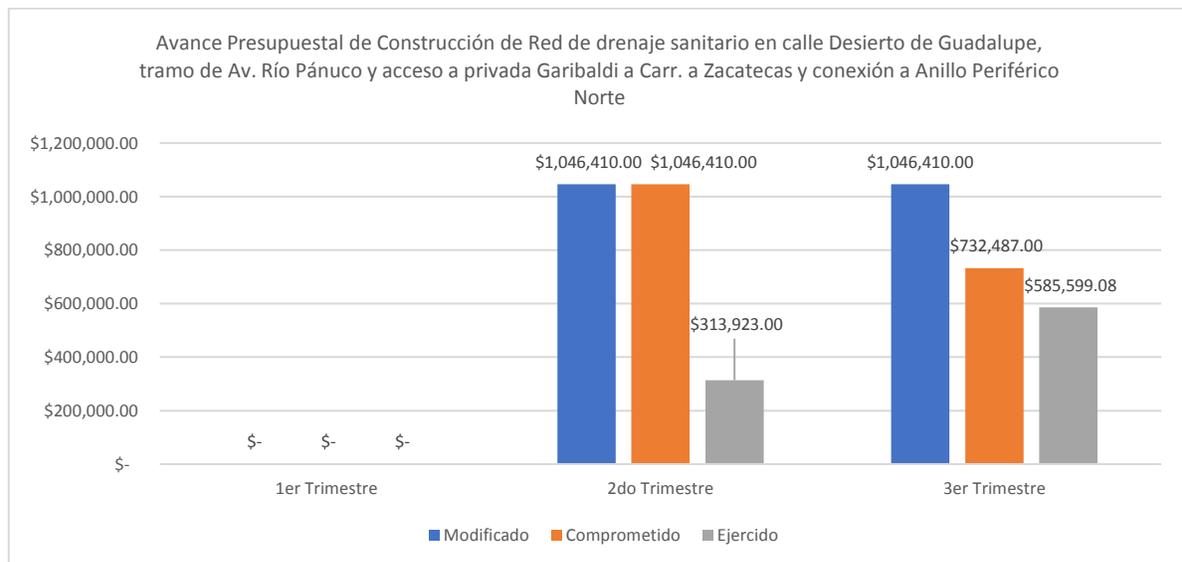

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

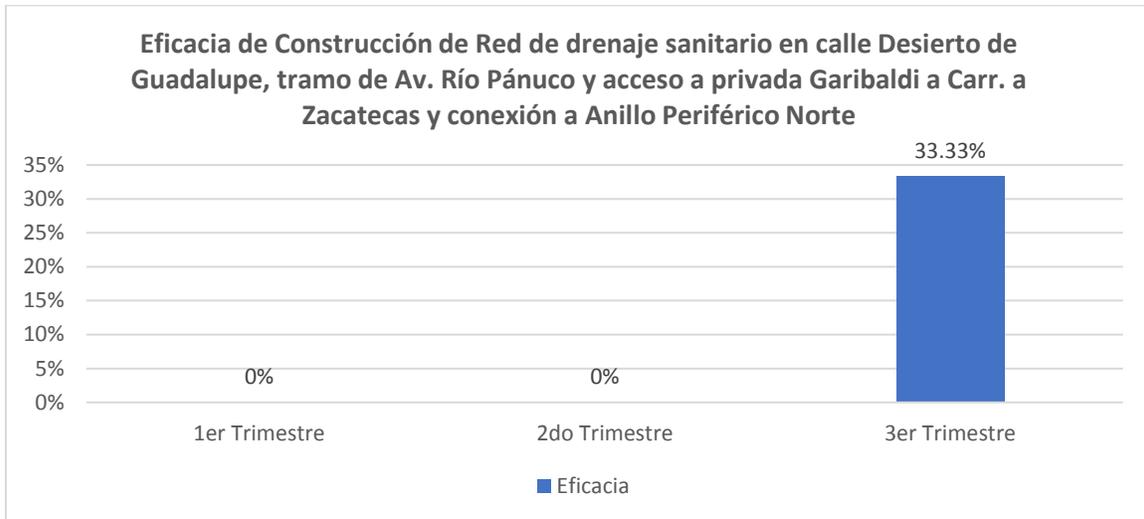


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

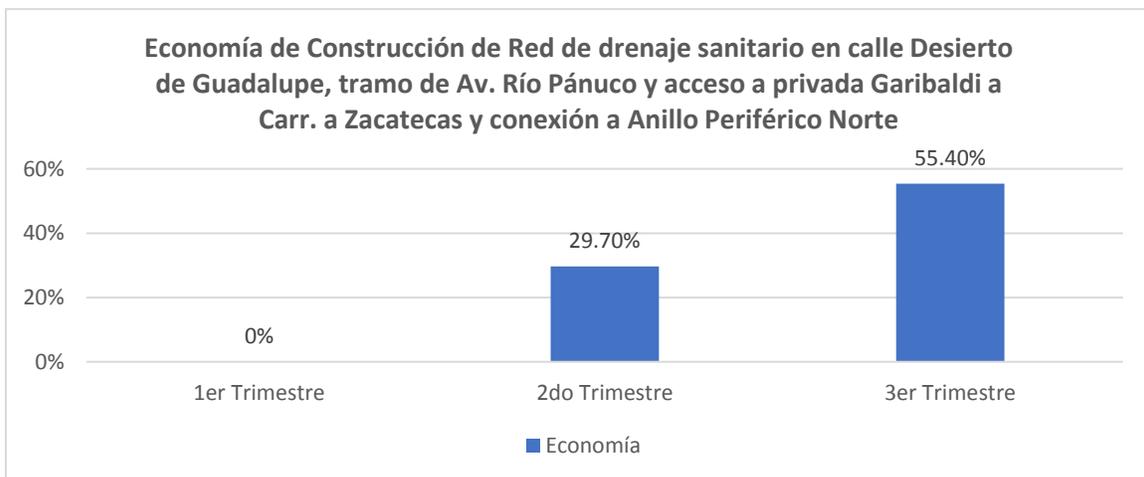

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019



6.4.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

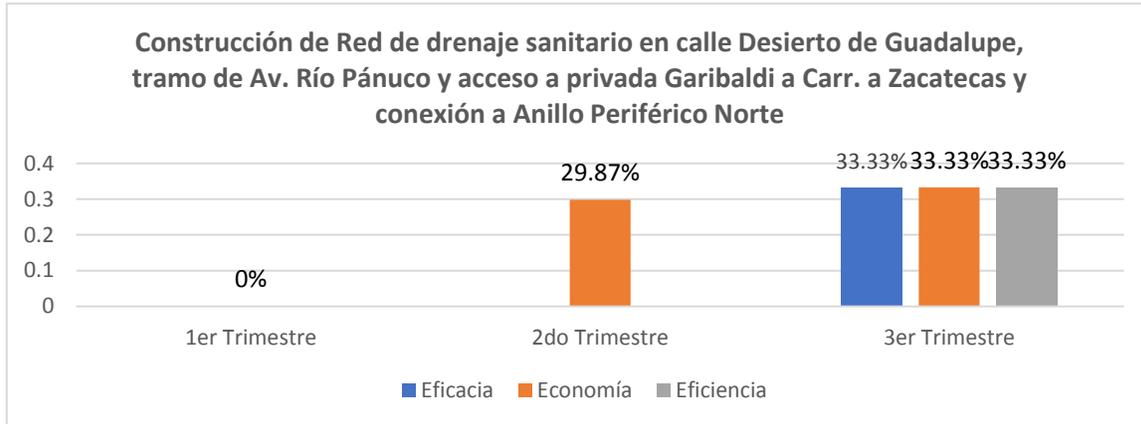

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente.


6.5.-Introducción de Red de Drenaje Sanitario en carretera San Luis- Zacatecas (lado oriente).

Asignación presupuestal: \$690, 995.22


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizando materiales duraderos.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

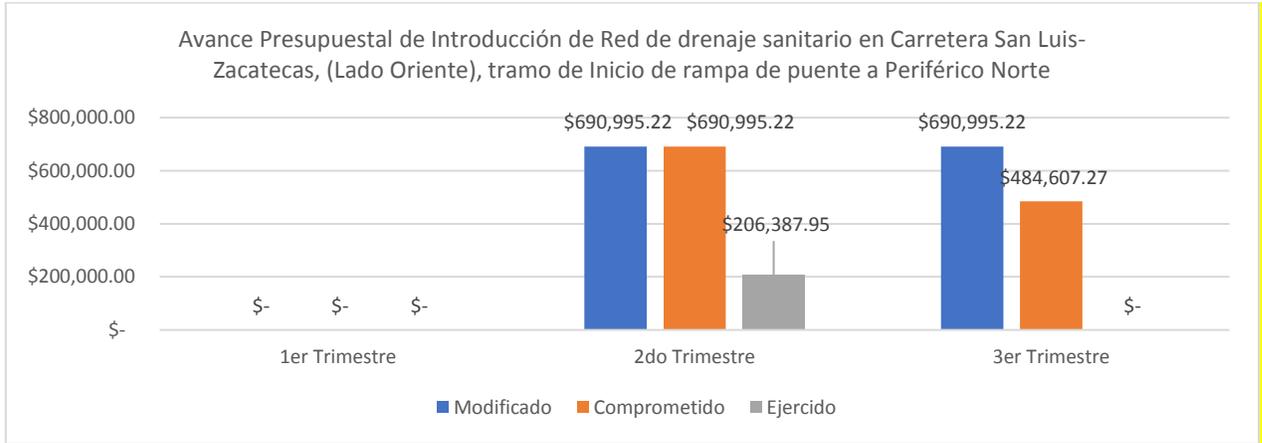

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

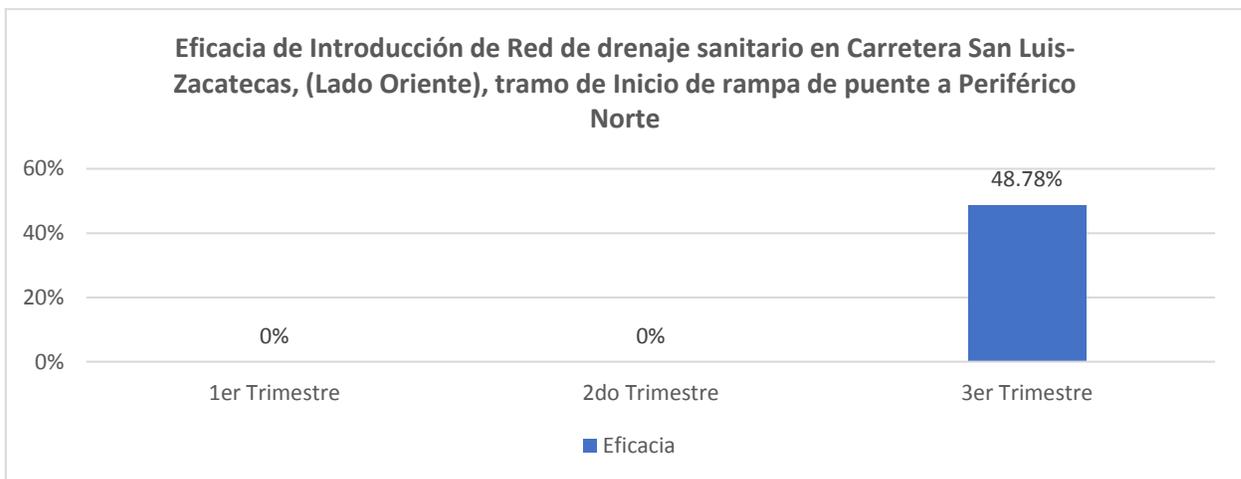


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

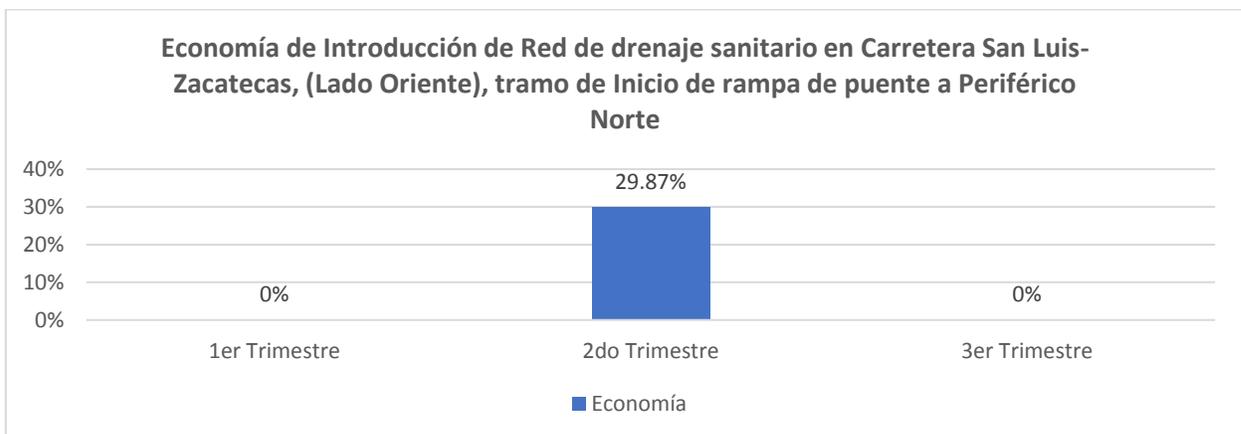

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.



6.5.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

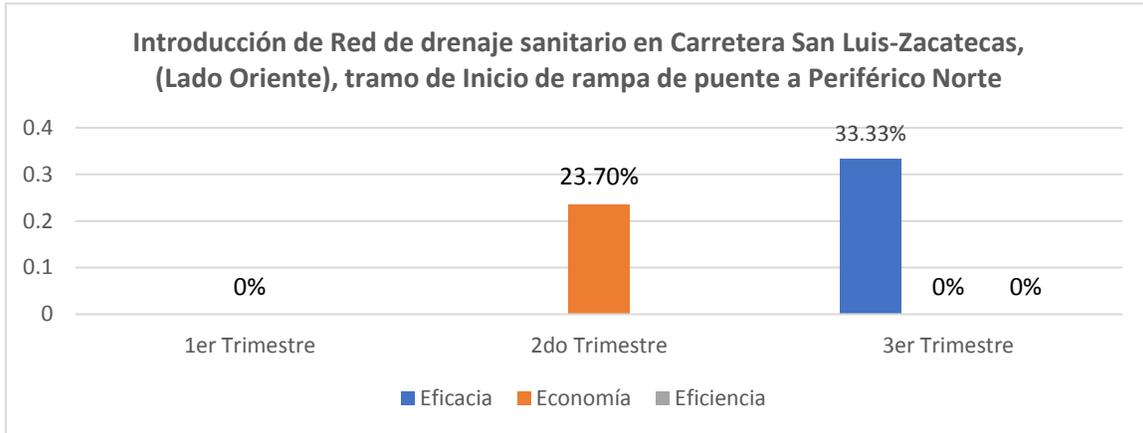

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; sin embargo, estos resultados no son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último no está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente, por lo que los resultados de eficiencia también se ven afectados. Asimismo, la Dirección de Obras Públicas no presentó ningún tipo de información institucional que justifique la manera en que se están cumpliendo sus objetivos sin ejercer ningún monto en el periodo.

6.6.- Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a la Av. Industrias.

Asignación presupuestal: \$4,908,479.87


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es




contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

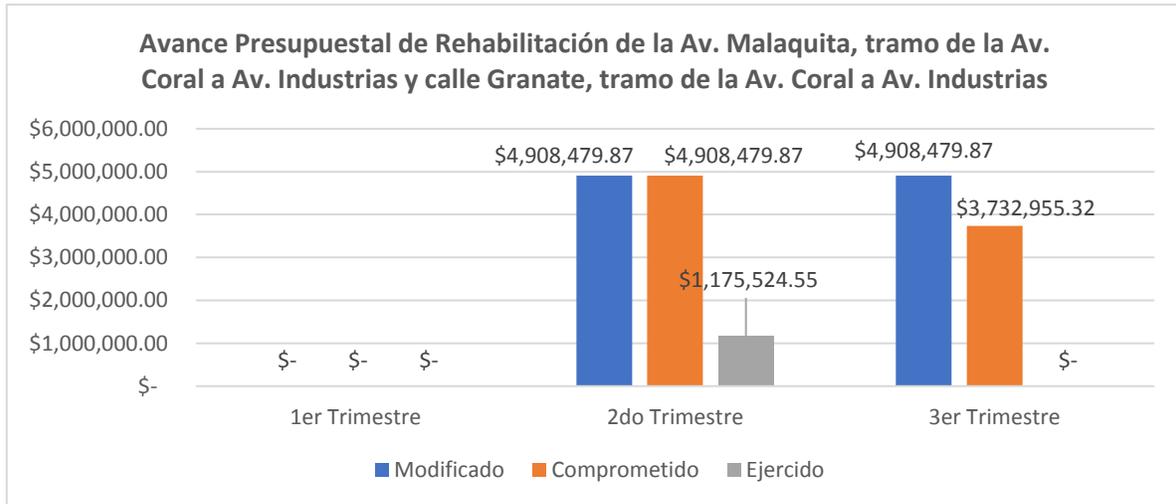

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

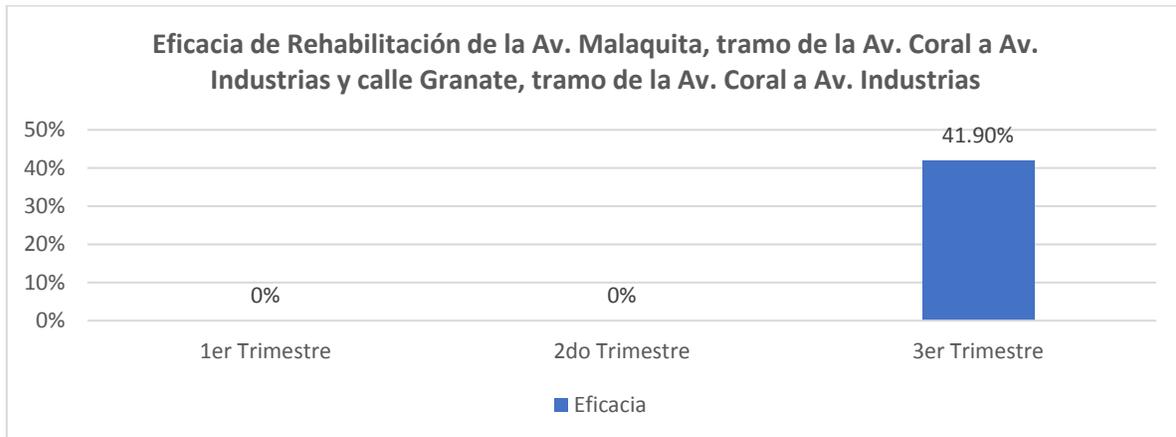


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

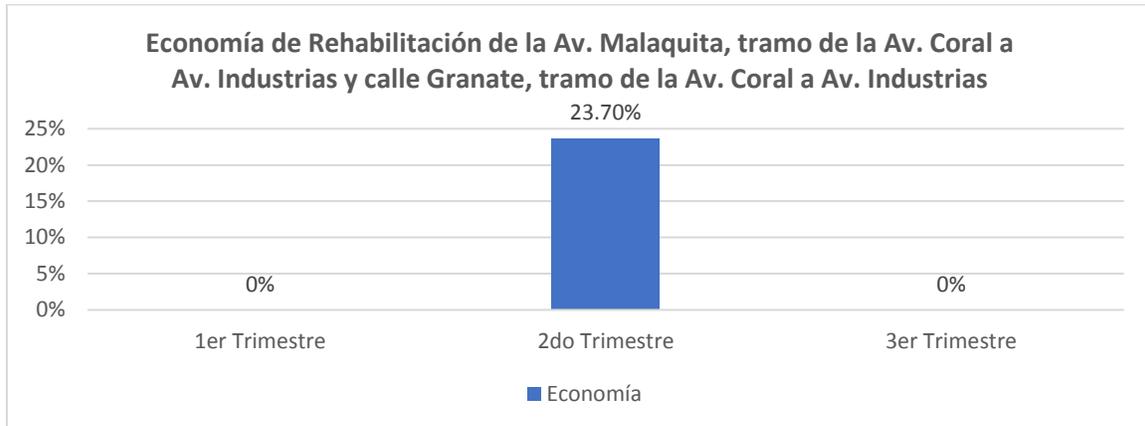

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.6.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

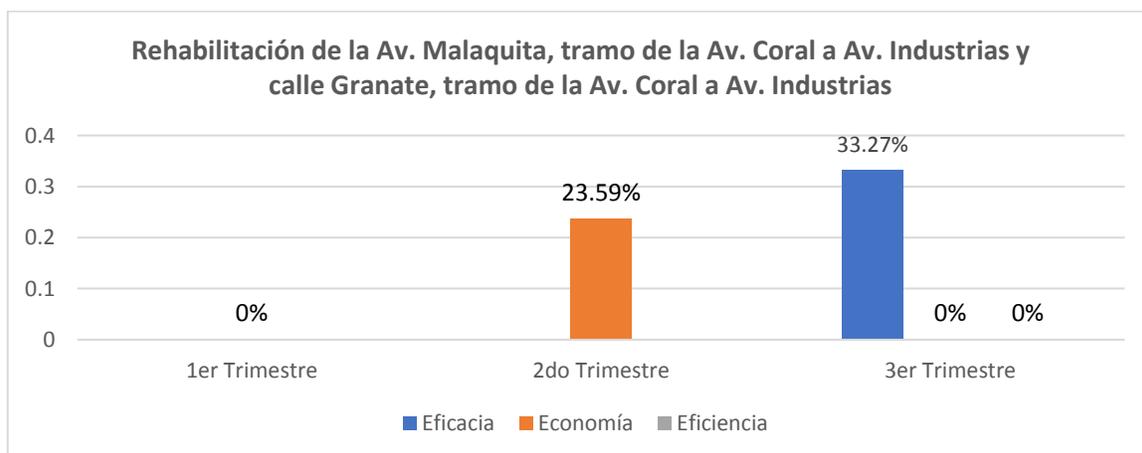

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; sin embargo, estos resultados no son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último no está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente, por lo que los resultados de eficiencia también se ven afectados. Asimismo, la Dirección de Obras Públicas no presentó ningún tipo de información institucional que justifique la manera en que se están cumpliendo sus objetivos sin ejercer ningún monto en el periodo.




6.7.- Rehabilitación de calle Arenal, tramo de Calle Acceso Norte a las vías del FFCC.

Asignación presupuestal: \$3,336,235.72


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

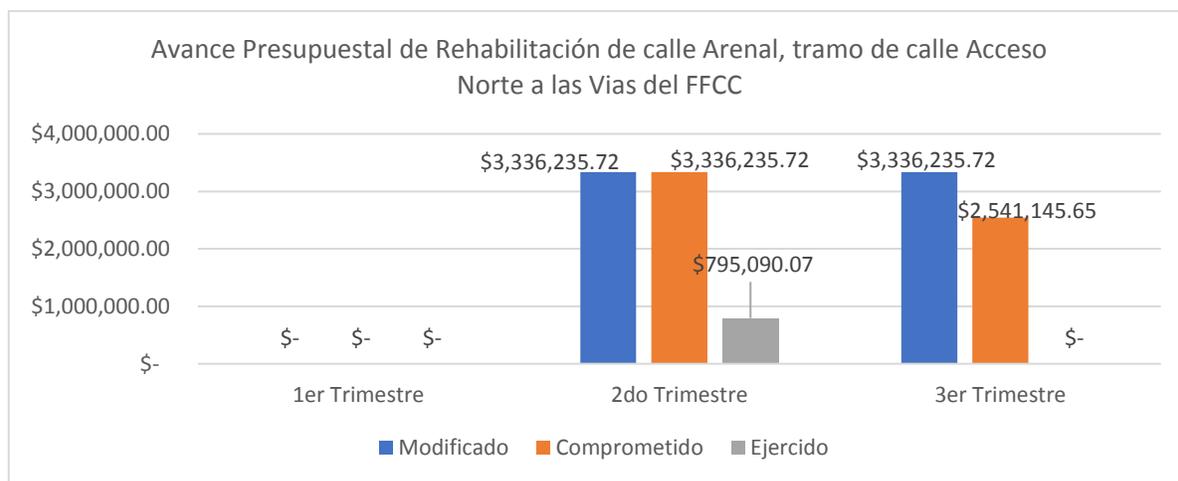

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

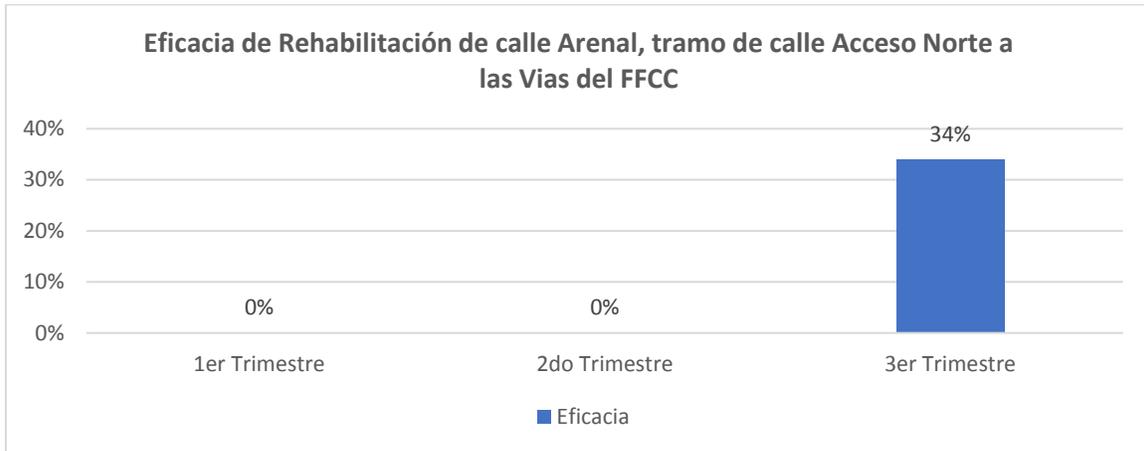


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

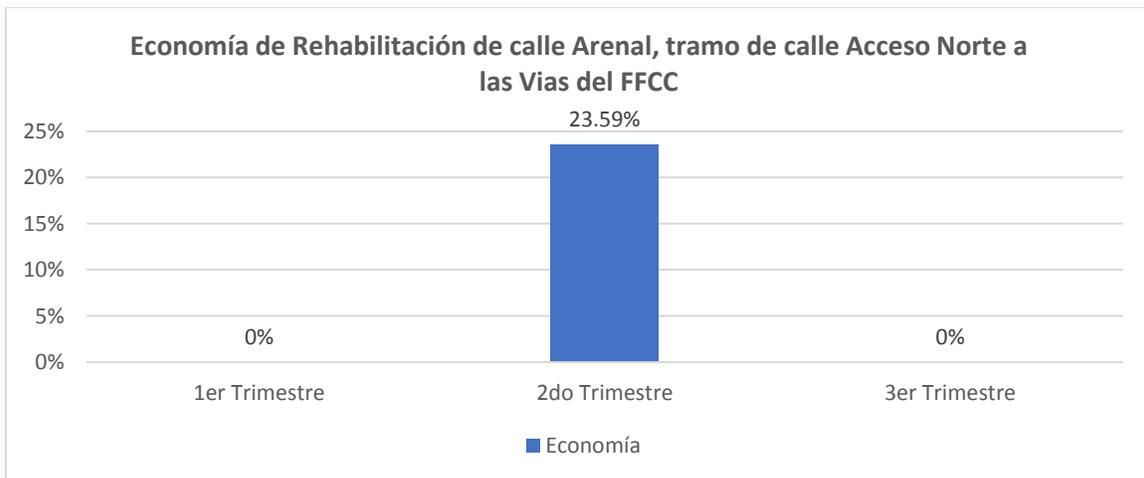

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.7.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

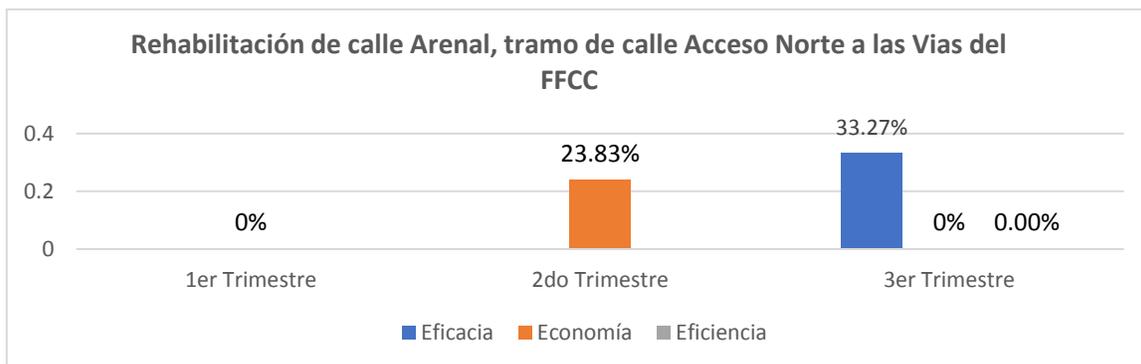

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.



Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; sin embargo, estos resultados no son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último no está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente, por lo que los resultados de eficiencia también se ven afectados. Asimismo, la Dirección de Obras Públicas no presentó ningún tipo de información institucional que justifique la manera en que se están cumpliendo sus objetivos sin ejercer ningún monto en el periodo.


6.8.- Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez.

Asignación presupuestal: \$1,835,366.86


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

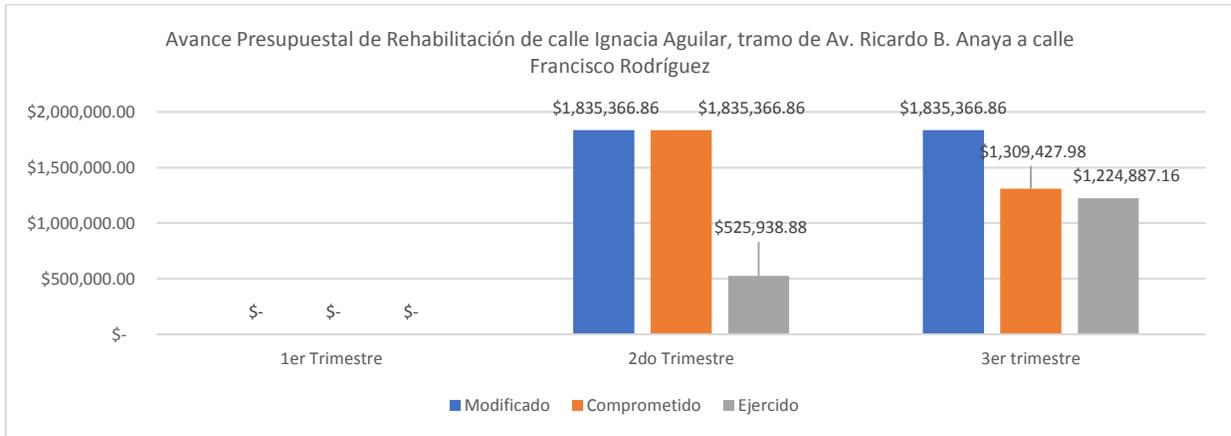

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

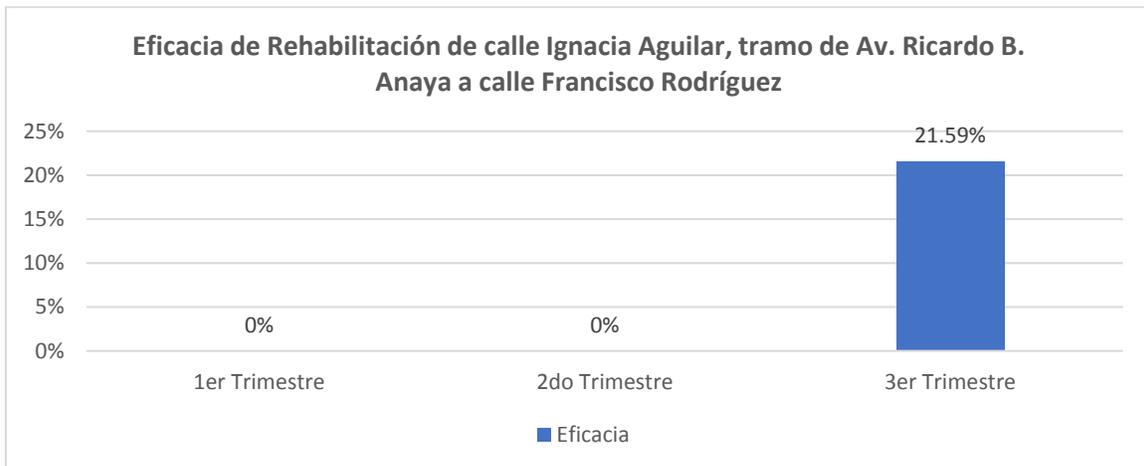


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

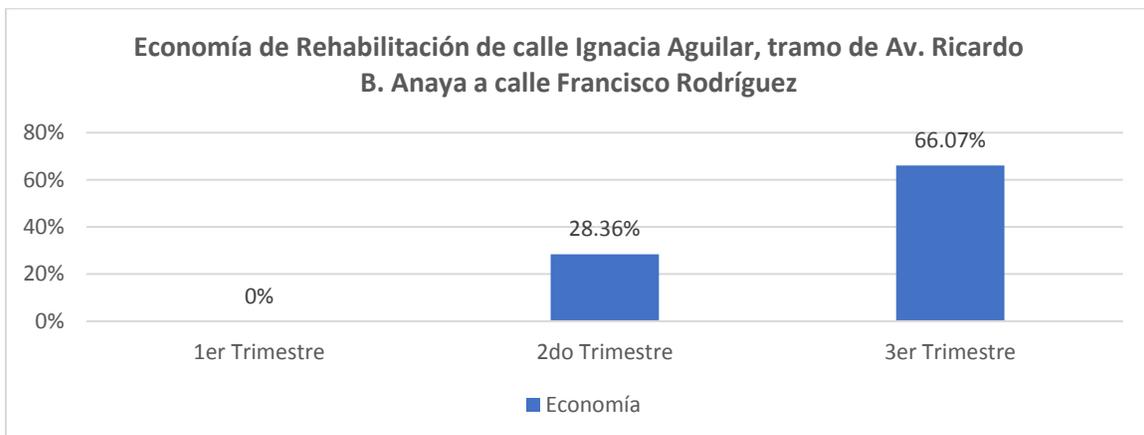

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.



6.8.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

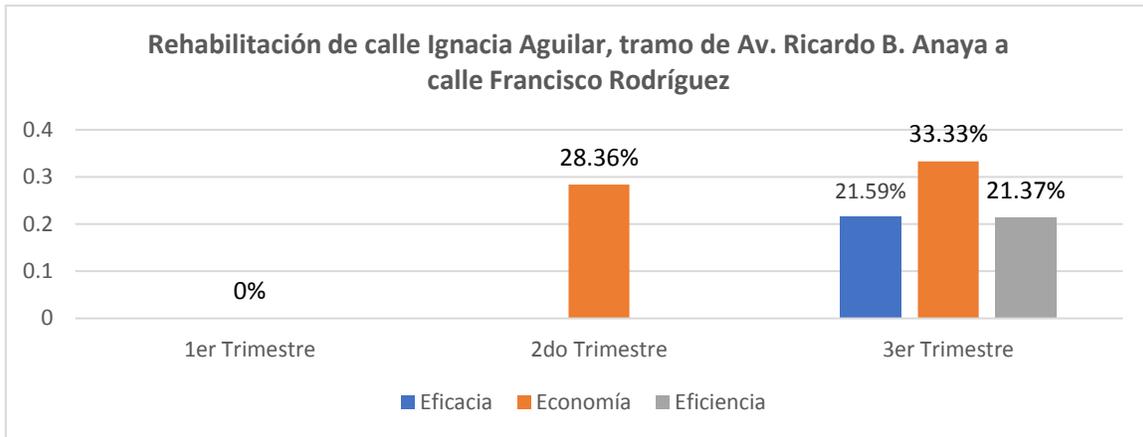

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es poco eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados no son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente, por lo que se pudiese concluir que económicamente están en condiciones de elevar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas.

6.9.- Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacio Aguilar a Lidia Pérez.

Asignación presupuestal: \$3,863,454.41


Objetivo: Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es




contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía.
Así, se presenta lo siguiente:

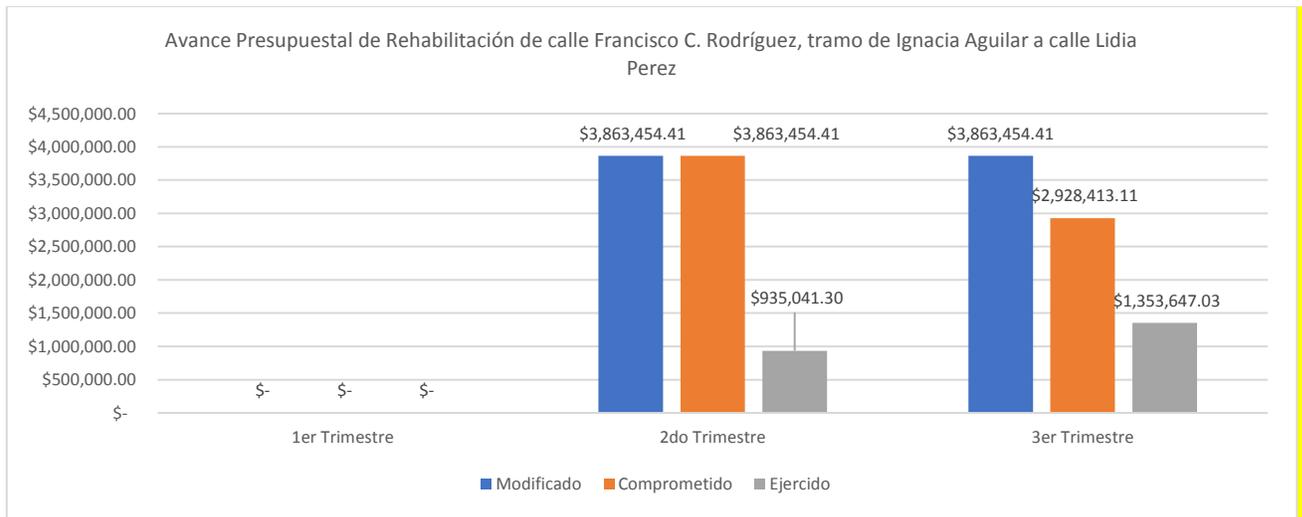

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

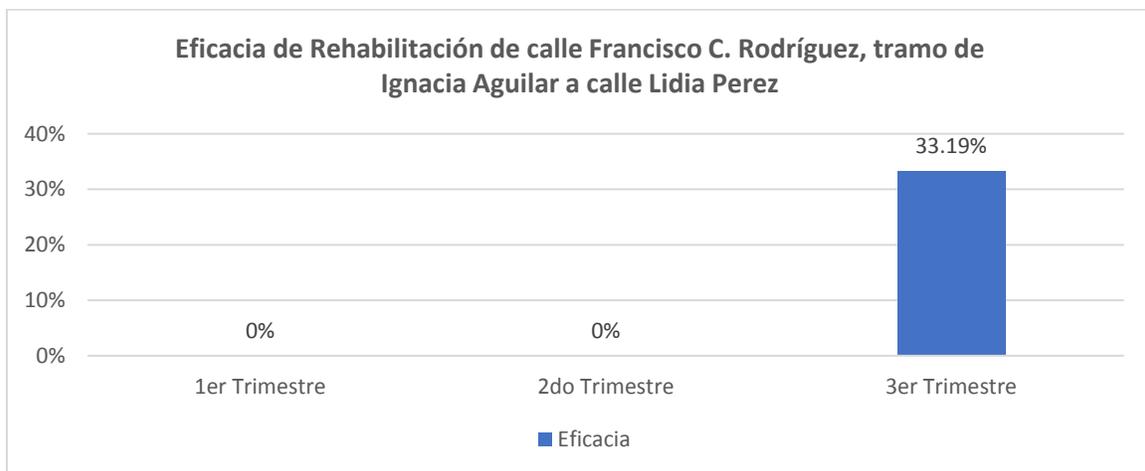


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

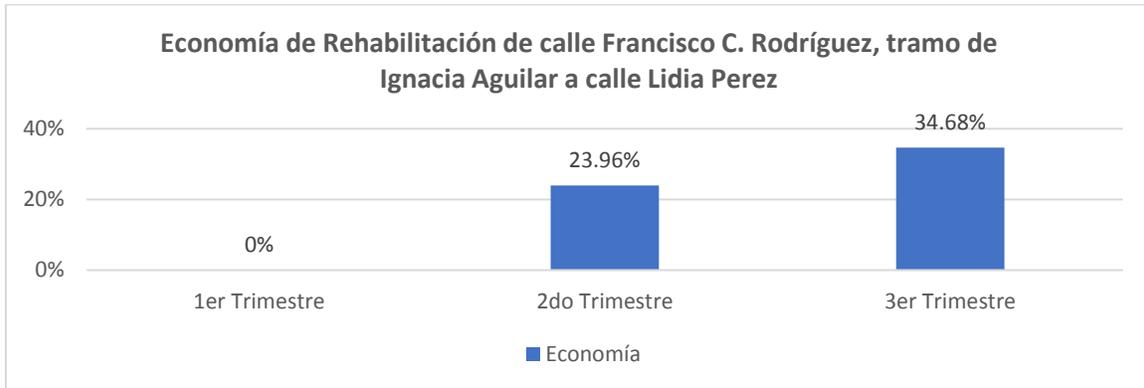

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.9.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

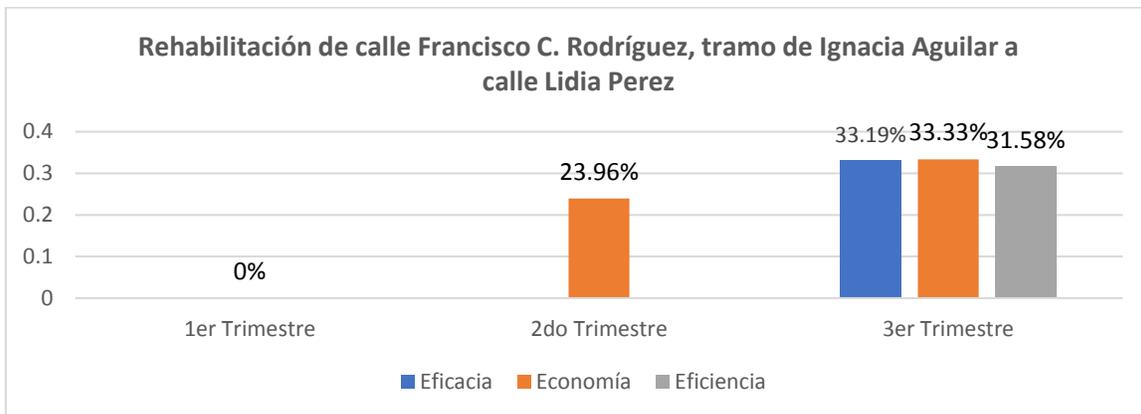

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es altamente eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente.




6.10.-Programa emergentes de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio de Fanduas, tramo de Av. José de Gálvez a calle Israel.

Asignación presupuestal: \$5,023,722.57


Objetivo: Dar mantenimiento a las arterias viales del territorio municipal con materiales adecuados de alta calidad.

Algoritmo del indicador: (Avance físico real de la obra/ avance físico programado) X100


Según los resultados proporcionados por la Tesorería Municipal sobre el avance financiero alcanzado se desprende el siguiente análisis en donde se puede observar el comportamiento presupuestal en el segundo y tercer trimestre del año del proyecto evaluado. Asimismo, en las gráficas posteriores se observa el comportamiento de la eficacia y economía sin normalizar los resultados al 33.33%. Finalmente, se reitera el señalamiento del punto cinco sobre el excedente ya sea en los casos de eficacia, eficiencia, economía o calidad; el cual debe interpretarse como una situación **no favorable** dado que el ideal es contar con una evolución gradual y equivalente en el ejercicio de la eficacia y la economía. Así, se presenta lo siguiente:

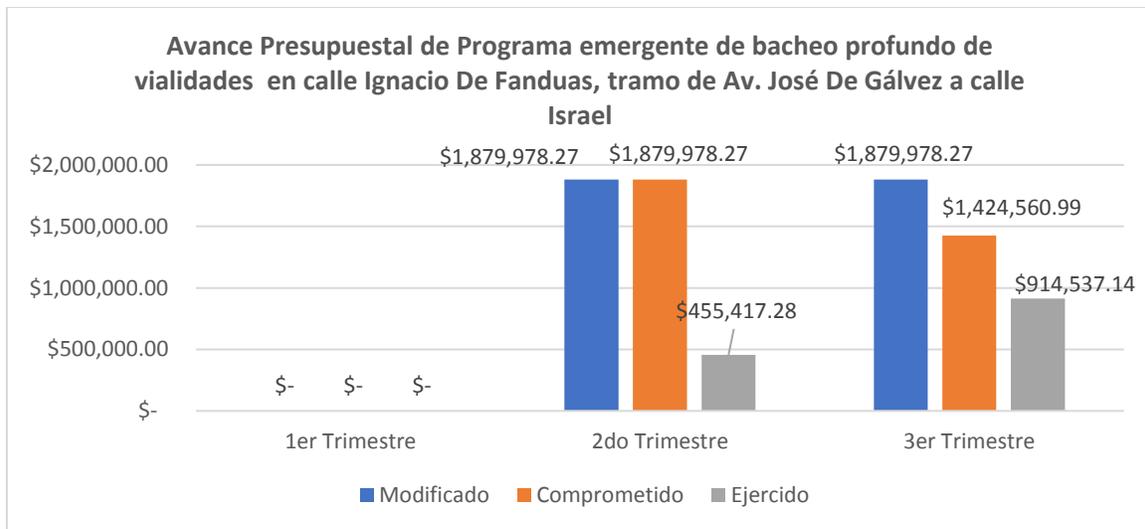

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

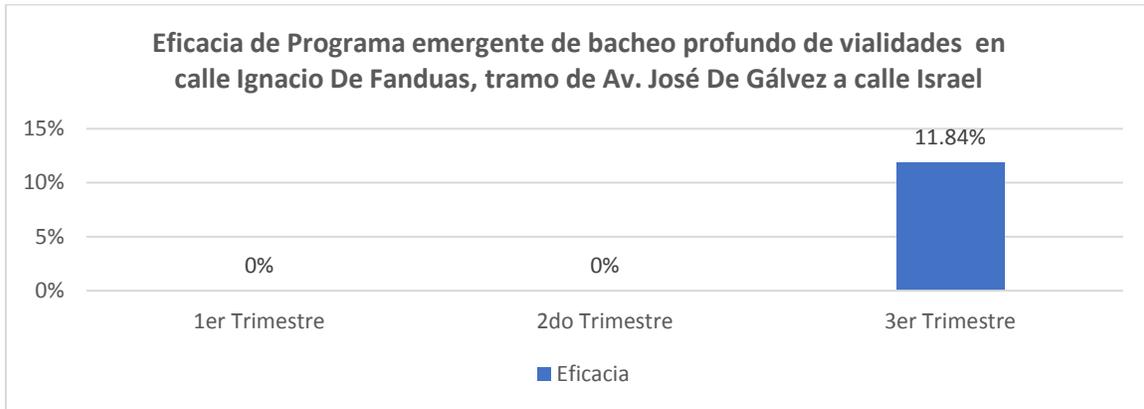


Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.

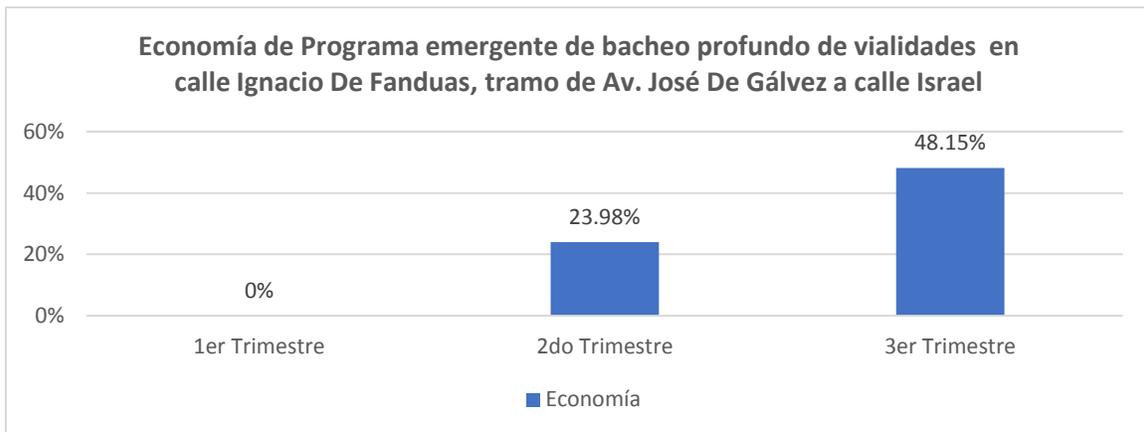

Fuente: Elaboración propia con información de TM Presupuestal 2019.

6.10.1 Resultados De Eficacia, Eficiencia, Economía Y Calidad ponderados y normalizados

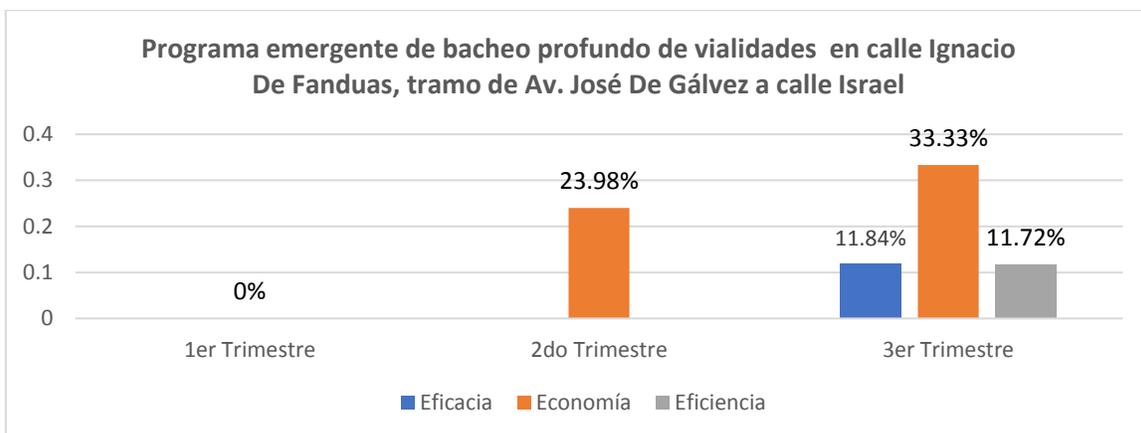

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Obras Públicas.



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Finalmente se concluye que la Unidad Administrativa evaluada es poco eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el presente proyecto evaluado; además, estos resultados no son proporcionales y/o graduales con respecto al ejercicio de los recursos, ya que este último está siendo ejercido de acuerdo con lo programado trimestralmente.



7.- Valoración General de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.

Con base en la información proporcionada por parte de la Dirección de Obras Públicas en numeral DOP/CA/1628/2019, así como con base en el TM presupuestal del tercer trimestre proporcionado por la Dirección de Tesorería y en análisis de Gabinete de la Contraloría Interna se presenta la siguiente valoración general de eficacia, eficiencia, economía y calidad:

Valoración de Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad en el Tercer Trimestre				
Proyecto	Eficacia	Eficiencia	Economía	Calidad
1.-Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N	Adecuado	Adecuado	Atención Operacional	N/A
2.-Construcción de Red de drenaje sanitario en privada Bugambilias de la Cruz.	Deficiente	Deficiente	Adecuado	N/A
3.-Construcción de Red de drenaje sanitario en 1ª. Privada de Colorines.	Adecuado	Adecuado	Adecuado	N/A
4.-Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe	Adecuado	Adecuado	Adecuado	N/A
5.-Introducción de Red de Drenaje Sanitario en carretera San Luis- Zacatecas (lado oriente).	Adecuado	Deficiente	Deficiente	N/A
6.-Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a la Av. Industrias.	Adecuado	Deficiente	Deficiente	N/A
7.-Rehabilitación de calle Arenal, tramo de Calle Acceso Norte a las vías del FFCC.	Adecuado	Deficiente	Deficiente	N/A
8.-Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez.	Deficiente	Deficiente	Adecuado	N/A
9.-Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacio Aguilar a Lidia Pérez.	Adecuado	Adecuado	Adecuado	N/A
10.-Programa emergentes de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio de Fanduas, tramo de Av. José de Gálvez a calle Israel	Deficiente	Deficiente	Adecuado	N/A



8.- Seguimiento. Aspectos Susceptibles de Mejora.

Con base en el artículo 40 de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, “Las Unidades Administrativas deberán atender de manera trimestral y/o anual los resultados de las evaluaciones y los ASM; ya que son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el Subsistema de Seguimiento y de Evaluación. Lo anterior a fin de lograr la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador interno y/o externo y contribuir en la optimización del desempeño de los Pp y de las políticas públicas”. Con base en lo anterior, se solicita lo siguiente:

ASM 1.- Elaborar y presentar a este Órgano de Control Interno el indicador y los datos necesarios que permitan medir la calidad en el ejercicio del recurso en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral.

ASM 2.- Presentar en tiempo y forma a este órgano de control interno la información solicitada, es decir, remitir dicha información a más tardar a los diez días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre.

ASM 3.-Elaborar y presentar a este Órgano de Control Interno los medios de verificación que permitan corroborar las metas alcanzadas en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral correspondientes al tercer trimestre, es decir los medios de verificación de los avances físicos proporcionados.

ASM 4.-Determinar y presentar a este Órgano de Control Interno la población objetivo y población beneficiada en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral.

ASM 5.- Buscar lograr una armonización entre el presupuesto ejercido y las metas alcanzadas y programadas.



Formato de Aspectos Susceptibles de Mejora.

Tema	No.	ASM	Prioridad			Tipo de ASM				Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Área responsable	Evidencia Documental
			Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental				
Calidad.	1	Elaborar y presentar a este Órgano de Control Interno el indicador y los datos necesarios que permitan medir la calidad en el ejercicio del recurso en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Entrega de Información	2	Presentar en tiempo y forma a este órgano de control interno la información solicitada, es decir, remitir dicha información a más tardar a los diez días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Medios de Verificación.	3	Elaborar y presentar a este Órgano de Control Interno los medios de verificación que permitan corroborar las metas alcanzadas en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral correspondientes al tercer trimestre, es decir los medios de verificación de los avances físicos proporcionados.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Población objetivo.	4	Determinar y presentar a este Órgano de Control Interno la población objetivo y población beneficiada en todos los programas sujetos a seguimiento y/o monitoreo trimestral.	X			X						Dirección de Obras Públicas	
Resultados.	5	Buscar lograr una armonización entre el presupuesto ejercido y las metas alcanzadas y programadas.	X			X						Dirección de Obras Públicas	



9. Anexos Formato 1. Fichas de Monitoreo por Pp.

FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Nombre del Programa:	Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N		
Clave del Pp:	2884408		
Monto otorgado:	\$798,650.00		
Fecha de Alta del Pp:	02/05/2019		
Eje de Gobierno:	2.12 Recurso Hídrico		
Línea Estratégica:	2.12.1 Agua para Todos		
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.		
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas		
Clasificación Económica:	Capital		
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM		
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		
AVANCE PRESUPUESTARIO			
	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 266,216.00	\$ 239,590.18	29.69%
3er Trimestre	\$ 266,216.00	\$ 190,670.84	23.63%
4to Trimestre			
AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS			
	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	33.33%	46.54% (33.33%)	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Bugambilias De la Cruz, tramo de calle De la Cruz a Fin de Privada
Clave del Pp:	2884413
Monto otorgado:	\$534,050.00
Fecha de Alta del Pp:	02/05/2019
Eje de Gobierno:	2.12 Recurso Hídrico
Línea Estratégica:	2.12.1 Agua para Todos
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicos y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 178,016.66	\$ 158,120.25	29.31%
3er Trimestre	\$ 178,016.66	\$ 269,498.77	49.95% (33.33%)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	17.40%	17.22%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Construcción de Red de drenaje sanitario en 1ª. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada
Clave del Pp:	2884416
Monto otorgado:	\$540,250.00
Fecha de Alta del Pp:	02/05/2019
Eje de Gobierno:	2.12 Recurso Hídrico
Línea Estratégica:	2.12.1 Agua para Todos
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 180,083.33	\$ 159,733.03	29.27%
3er Trimestre	\$ 180,083.33	\$ 324,219.79	59.41% (33.33%)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	30.08%	29.78%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe, tramo de Av. Río Pánuco y acceso a privada Garibaldi a Carr. a Zacatecas y conexión a Anillo Periférico Norte
Clave del Pp:	2884419
Monto otorgado:	\$1,046,140.00
Fecha de Alta del Pp:	02/05/2019
Eje de Gobierno:	2.12 Recurso Hídrico
Línea Estratégica:	2.12.1 Agua para Todos
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 348,803.33	\$ 313,923.00	29.70%
3er Trimestre	\$ 348,803.33	\$ 585, 599.08	55.40% (%33.33)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	33.33%	33.33%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas, (Lado Oriente), tramo de Inicio de rampa de puente a Periférico Norte
Clave del Pp:	2884420
Monto otorgado:	\$690, 995.22
Fecha de Alta del Pp:	02/05/2019
Eje de Gobierno:	2.12 Recurso Hídrico
Línea Estratégica:	2.12.1 Agua para Todos
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 230,331.74	\$ 206,387.95	29.87%
3er Trimestre	\$ 230,331.74	\$ 0.00	0%
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	48.78% (33.33%)	0.00%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias
Clave del Pp:	2884402
Monto otorgado:	\$4,908,479.87
Fecha de Alta del Pp:	29/05/2019
Eje de Gobierno:	3.2 SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD
Línea Estratégica:	3.2.3 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 1,636,159.96	\$ 1,175,524.55	23.70%
3er Trimestre	\$ 1,636,159.96	\$ 0.00	0%
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	41.90% (33.33%)	0.00%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vías del FFCC
Clave del Pp:	2884423
Monto otorgado:	\$3,336,235.72
Fecha de Alta del Pp:	08/05/2019
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 1,112,078.57	\$ 795,090.07	23.59%
3er Trimestre	\$ 1,112,078.57	\$ 0.00	0.00%
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	33.27%	0.00%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez
Clave del Pp:	2884424
Monto otorgado:	\$1,835,366.86
Fecha de Alta del Pp:	28/05/2019
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 611,788.95	\$ 525,938.88	28.36%
3er Trimestre	\$ 611,788.95	\$ 1, 224,887.16	66.07% (33.33%)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	21.59%	21.37%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacia Aguilar a calle Lidia Pérez
Clave del Pp:	2884427
Monto otorgado:	\$3,863,454.41
Fecha de Alta del Pp:	22/05/2019
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 1,287,818.14	\$ 935,041.30	23.96%
3er Trimestre	\$ 1,287,818.14	\$ 1,353,647.03	34.68% (33.33%)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	33.19%	31.58%	N/A
4to Trimestre			



FICHA MONITOREO TRIMESTRE 3, 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel
Clave del Pp:	2884436
Monto otorgado:	\$5,023,722.57
Fecha de Alta del Pp:	30/05/2019
Eje de Gobierno:	3.2 Sostenibilidad de la Ciudad
Línea Estratégica:	3.2.3 Mantenimiento de la Ciudad
Objetivo:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.
Unidad Responsable:	Dirección de Obras Públicas
Clasificación Económica:	Capital
Tipo de Financiamiento:	Ramo XXXIII FFM
Partida Presupuestal:	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$ -	\$ -	N/A
2do Trimestre	\$ 626,659.42	\$ 455,417.28	23.98%
3er Trimestre	\$ 626,659.42	\$ 914, 537.14	48.15% (33.33%)
4to Trimestre			

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1er Trimestre	N/A	N/A	N/A
2do Trimestre	0.00%	0.00%	0.00%
3er Trimestre	11.84%	11.72%	N/A
4to Trimestre			



10.-Anexos formato 2. Fichas de Monitoreo por Indicador.

1.- Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Manuel Acuña.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros lineales	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Construcción de red de drenaje sanitario incluye: Demoliciones, red de drenaje sanitario y trabajos varios.				Avance físico del 58.89%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	30%	0%
		3er	58.89%	58.05%	33.33	33.33%	23.63%	N/A
	4to							

2.- Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Bugambilias De la Cruz, tramo de calle De la Cruz a Fin de Privada.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros lineales	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Construcción de red de drenaje sanitario incluye: Demoliciones, red de drenaje sanitario y trabajos varios.				Avance físico de 90.53%			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	29.61%	0%
		3er	90.53%	47.74%	17.40%	17.22%	33.3%	N/A
	4to							



3.- Construcción de Red de drenaje sanitario en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros lineales	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Construcción de red de drenaje sanitario incluye: Demoliciones, red de drenaje sanitario y trabajos varios.					Avance físico de 15%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	29.57%	0%
		3er	15%	14%	30.08	29.78%	33.33%	N/A
	4to							

4.- Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros lineales	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Demoliciones, red de drenaje sanitario, reposición de pavimentos, banquetas y guarniciones.					Avance físico de 45%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	30%	0%
		3er	45%	45%	33.33	33.33%	33.33%	N/A
	4to							



5.- Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, con redes hidráulicas y sanitarias, utilizado materiales más duraderos.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
		Metros lineales	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Construcción de red de drenaje sanitario incluye: Demoliciones, red de drenaje sanitario y trabajos varios.					Avance físico de 23%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	%29.87	0%
		3er	23%	34%	33.33	0%	0%	N/A
	4to							

6.- Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado)x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Mts ²	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Reposición de sistema de alcantarillado y red de agua potable y pavimento de concreto hidráulico.					Avance físico de 54.61%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	23.95%	0%
		3er	54.61%	67.86%	33.33	0%	0%	0%
	4to							



7.- Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vías del FFCC.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros cuadrados	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Incluye: preliminares, demoliciones, excavación en corte, compactación de terreno natural, base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico.					Avance físico de 73.38%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	23.8%	0%
		3er	73.38%	76.60%	33.33	0%	0%	N/A
	4to							

8.- Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez.

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros cuadrados	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN					CANTIDAD PROGRAMADA		
Sin especificar	Incluye: preliminares, demoliciones, excavación en corte, compactación de terreno natural, base hidráulica y carpeta de concreto hidráulico.					Avance físico de 82.70%		
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	28.66%	0%
		3er	82.70	54.13	21.59	21.37%	33.3%	0%
	4to							



9.- Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez

Nombre:	Rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana del territorio municipal, consolidando las superficies de rodamiento con óptima calidad.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros cuadrados	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Incluye: preliminares, demoliciones, excavación en corte, compactación de terreno natural, base hidráulica y carpeta de concreto hidráulico.				Avance físico de 85.86			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	24.20%	0%
		3er	85.35	85.86	33.19	31.58%	33.33%	N/A
	4to							

10.- Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel

Nombre:	Dar mantenimiento a las arterias viales del territorio municipal, con los materiales adecuados de alta calidad.							
Tipo de Indicador:	Estratégico							
Algoritmo:	(avance real de la obra/ avance programado) x100							
Comportamiento:	Ascendente							
Línea Base	Valor	Unidad de Medida	Año	Mes				
	N/A	Metros cuadrados	2019	Septiembre				
NIVEL	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD PROGRAMADA			
Sin especificar	Bacheo profundo en vialidades con concreto hidráulico.				Avance físico de 94.56			
	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	CALIDAD
		1er	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2do	Sin especificar	Sin especificar	0%	0%	24.22%	0%
		3er	94.56	33.94	11.84	11.72%	33.33%	N/A
	4to							
